

担当課	水道施設課
担当者	太田
電話	435-1127
内線	3252

紀の川送水管複線化工事の進捗について

紀の川送水管複線化工事の掘削のためのシールドマシンが設置されました。今後、工事の完成により水道管路耐震性とリダンダンシーが向上します。

○進捗状況

令和7年7月29日 工事着手
 令和7年10月初旬 シールドマシン製作開始
 令和7年11月初旬 発進立坑築造開始
 令和8年6月中旬 発進立坑完成、シールドマシン完成
 令和8年7月23日 シールドマシン現場搬入

○今後の予定


令和9年5月末 送水管河川横断部分完成（——部）
 令和9年6月初旬 既設管との接続工事開始（……部）
 令和10年3月 通水および工事完成



【全体工事概略図】



【シールドマシン搬入状況①】

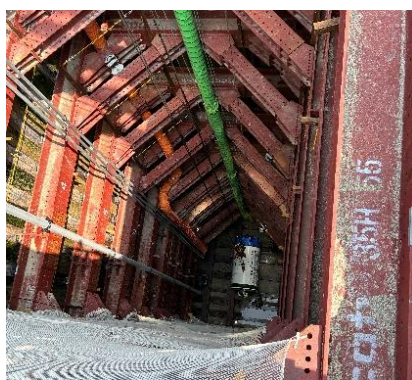

【シールドマシン搬入状況②】



【シールドマシン搬入状況③】
