

和企下企 第 277 号  
令和 7 年 11 月 20 日  
(2025 年)


和歌山市 企業局  
下水道部 下水道企画建設課長

質 問 回 答 書


令和 7 年 11 月 18 日付けで質問のあったことについて、次のとおり回答します。

年 度	令和7年度	
工 事（業 務）番 号	第25100060号	
工 事（業 務）名	松江雨水幹線工事その2	
工 事（業 務）場 所	和歌山市松江東3丁目地内から松江東4丁目地内まで	
質 問 事 項		回 答 事 項
○下水道工事		
① 積載情報 生コン、合材、石材の運搬車が4 t 指定になっておりますが、設計内訳書には明記がありません。設計には反映されるのでしょうか。 また、管材等の搬入、土砂、殻等の搬出時にも 4 t 車指定があるのでしょうか。		① 見積用設計書は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではありません。積算条件として、生コン、合材、石材の購入単価に反映されています。また、搬出時の積算条件は、一式当たり内訳書の規格欄、もしくは単価表に記載のとおりです。
② 設計書内訳書 第23号内訳書 推進用水替について、運転日数を何日で想定されていますか。日数未公表の場合は、算出のための根拠となる日数算出表は開示していただけますか。		② 施工計画を立案のうえ、必要と思われる日数を想定し、見積もってください。
③ 設計書内訳書 第23号内訳書 仮囲い ガードフェンス賃料について、賃料日数を		③ 施工計画を立案のうえ、必要と思われる日数を想定し、見積もってください。


<p>何日で想定されていますか。日数未公表の場合は、算出のための根拠となる日数算出表は開示していただけますか。また、賃貸料に加えて基本料も計上されていますか。</p> <p>また、ガードフェンスの設置・撤去は計上されていますか。</p>	<p>また、第28号内訳書のガードフェンス賃料に基本料は計上しております。</p> <p>ガードフェンス設置・撤去は計上しておりますが、見積用設計書の数量が誤りです。設計変更の対象とします。</p> <p>ガードフェンス賃料に関しては10.3t分賃料で見積をお願いします。</p>
<p>④ 設計書内訳書 第35号内訳書</p> <p>支保材（主材、腹部材、全損材）の数量を開示願います。</p>	<p>④ 主材15.3t、副部材10.3t、全損材0.92tです。</p>
<p>⑤ 設計書内訳書 第70号内訳書</p> <p>街路照明灯の規格、詳細図を開示願います。</p>	<p>⑤ 参考図を開示します。</p>
<p>⑥ 設計書内訳書 第72号内訳書 単-136</p> <p>N T Tケーブル防護に使用する土木シートの規格等を開示願います。</p>	<p>⑥ 土木シートはナイロン・ポリエステル系の1470N/3cmで想定しております。</p>

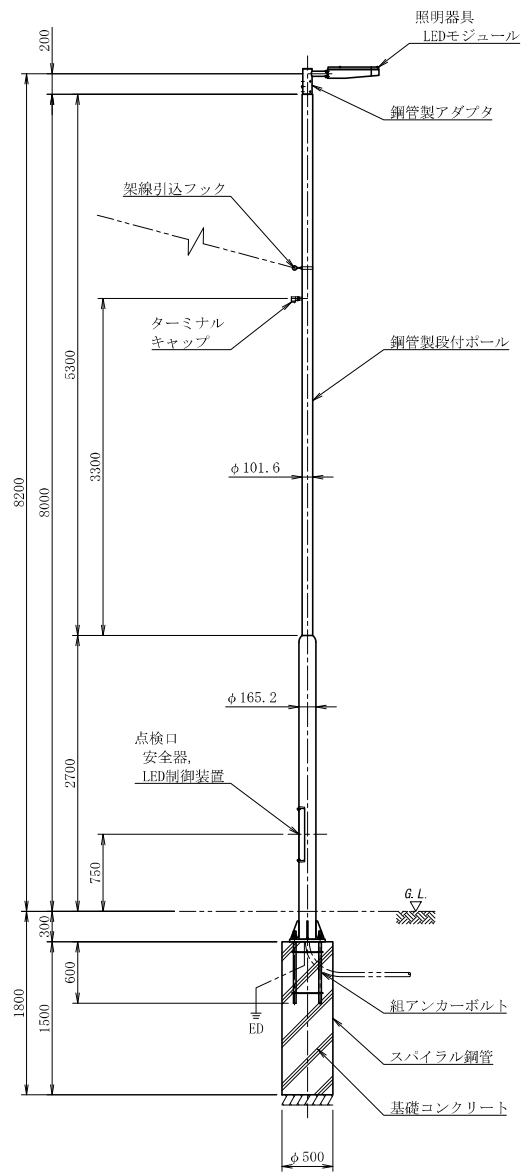


照明器具詳細



脚部詳細

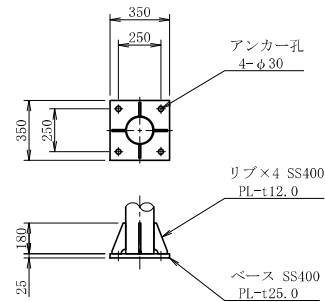

アンカーボルト詳細

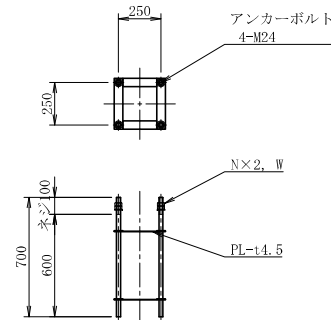

街路灯設置工材料表 1基あたり

名称	型式・形状・仕様	数量	単位	摘要
照明器具	HS-542VAC-7W24A6 SUS-t1.0, SUS-t1.2, アクリル, LEDモジュール (54W, 5000K, ワイド配光) 塗装仕上	1	台	LED制御 装置別置
鋼管製アダプタ	AD2-542V-ZP STK φ89.1-t3.2, STK φ48.6-t2.3 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	個	
鋼管製段付ボール	B-80-635SBZP STK φ165.2-t4.5, STK φ101.6-t3.2 溶融亜鉛メッキ後、塗装仕上	1	本	
組アンカーボルト	4M24-700-250 ネジ部溶融亜鉛メッキ	1	組	
架線引込フック	バンド付き	1	個	
ターミナルキャップ		1	個	
安全器		1	個	
LED制御装置		1	個	
電線		8.3	m	電源
D種接地材		1.5	m	接地
コンクリート		1	本	
スパイラル鋼管	φ500	0.295	m <sup>2</sup>	
切込砕石		1.5	m	
			m <sup>2</sup>	

ポール高さ：8.0 m  
発光部高さ：8.2 m

参考図

件名	
図面名	
年月日	
尺度	
会社名	
事務所名	

111069-S06-23061401
